




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE ARCHIDONA



**REPORTE ANUAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL 2020 Y EL ALCANCE DE LOS
PROYECTOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PDYOT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA**

ENERO - DICIEMBRE 2020

ING. ANDRÉS BONILLA

ALCALDE

CON OBRAS Y TRABAJO ARCHIDONA



RENACE



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE **A** RCHIDONA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.

Arq. Denis Martínez.

Director de Planificación

Ing. Cesar Velásquez Q.

Unidad de Desarrollo Cantonal



UNIDAD DE DESARROLLO CANTONAL

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. ANTECEDENTE.....	3
3. EMERGENCIA SANITARIA	3
4. BASE NORMATIVA	4
5. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020	5
6. DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	5
6.1 EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA.....	5
6.1.1 CONCEPTOS	5
6.1.2 ALCANCE DE LOS PROYECTOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDYOT)	6
6.1.3 ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS:.....	6
6.1.4 ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS:	7
7. RESUMEN GENERAL DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EN LA MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA	8
7.1 RESUMEN FINANCIERO	8
7.2 RESUMEN DE PROYECTOS	9
8. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 POR DIRECCIÓN	10
8.1 DIRECCIÓN DE TURISMO PROYECTOS	11
8.2 DIRECCIÓN DE TURISMO ANÁLISIS ECONÓMICO	12
8.3 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL – MIES PROYECTOS.	13
8.4 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL – MIES (ANÁLISIS ECONÓMICO).	14
8.5 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PROYECTOS.....	15
8.6 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO.	16
8.7 DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA PROYECTOS.....	17
8.8 DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA ANÁLISIS ECONÓMICO.	20
8.9 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROYECTOS.....	21
8.10 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ANÁLISIS ECONÓMICO.	24
9. EMERGENCIA SANITARIA PROYECTOS.....	25
10. CONCLUSIONES GENERALES.....	27

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y EL ALCANCE DE LOS PROYECTOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDYOT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA

1. INTRODUCCIÓN

Las actividades que se ejecutan en el GADMA, forman parte de un proceso que se rige por un ciclo de mejora continua, que busca incrementar las capacidades Institucionales y el Desarrollo del Cantón Archidona , mediante el logro de metas, que debe ser evaluado permanentemente y orientado al cumplimiento.

La Dirección de Planificación ha orientado el seguimiento, cumplimiento y formulación del Plan Operativo Anual (POA) acorde a las Directrices alineadas por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCS), con lo establecido para las instituciones públicas ecuatorianas, tanto en la Constitución de la República como en el Plan Nacional de Desarrollo "Toda una Vida" 2017-2021.

El Plan Operativo Anual (POA) es una de las herramientas de la Planificación Estratégica que se utiliza para llevar adelante la programación de las actividades definidas para el cumplimiento de los objetivos operativos de cada Dirección de la Municipalidad, con miras a alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

Este Plan Operativo Anual es un elemento articulador de lo estratégico y lo operativo y que permite presentar a la planeación estratégica en acciones concretas. El POA constituye además el instrumento de gestión administrativa que resume los objetivos y metas presupuestarias, así como, las actividades y tareas a desarrollarse en las diferentes Direcciones. Es un programa de acción con indicadores de gestión para monitorear, evaluar y consolidar su ejecución, o realizar los ajustes necesarios a fin de asumir nuevos retos y ser eficientes con los recursos asignados. La Dirección de Planificación es el área responsable de preparar y consolidar la información proporcionada por las diferentes Direcciones de la Municipalidad y de Apoyo, a fin de realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación respecto a su cumplimiento, y obtener los insumos necesarios para la elaboración de los reportes, los cuales son remitidos a la Máxima Autoridad-Concejales – Ciudadanía en general ,con el fin de mostrar el alineamiento a la Gestión Municipal.

2. ANTECEDENTE

Con este antecedente, se presenta el siguiente informe de ejecución del Plan Operativo Anual 2020, en donde se muestra el avance del cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos que son parte de la Planificación Operativa Anual y su ejecución presupuestaria, organizados por cada una de las Direcciones ejecutoras de obras o proyectos del Gobierno Municipal de Archidona con la finalidad de conocer el estado final de los proyectos del año fiscal 2020 y de esta manera para adoptar medidas futuras u oportunas para la reprogramación de acciones y toma de decisiones respecto a los proyectos.

3. EMERGENCIA SANITARIA

La ejecución de los Planes Operativos Anuales 2020, de cada una de las Direcciones del Gobierno Municipal de Archidona, se vio seriamente afectada a raíz de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria COVID-19. Los habitantes de la Cantón iniciaron un riguroso confinamiento que incluyó un toque de queda, restricciones de movilidad humana, etc., mientras la Economía del País se declinaba abruptamente.

La emergencia sanitaria obligó que muchas de las actividades programadas por la Municipalidad de Archidona, sufrieran serios traspasos presupuestarios, para lograr llegar con ayuda humanitaria a las personas más necesitadas, y así afrontar la emergencia sanitaria y mitigar los efectos en el Cantón. En base a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD, artículo 256, que indica que el ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado podrá autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área o dependencia, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos exista la disponibilidad suficiente

4. BASE NORMATIVA

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:

Art. 6.-“... 4: Seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas.- Consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones públicas. Para este propósito, se debe monitorear y evaluarla ejecución presupuestaria y el desempeño de las entidades, organismos y empresas del sector público en función del cumplimiento de las metas de la programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo...”

Art. 50.-“Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.-Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran”.

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos emitidas por la Contraloría General del Estado

:200-02“Administración estratégica.-Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan **evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional**”.

600-01 “Seguimiento continuo o en operación La máxima autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán un seguimiento constante del ambiente interno y externo que les permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de las actividades institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos previstos”.

5. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

El proceso de Planificación persigue articular de la mejor manera la Planificación con el presupuesto institucional, de aquí que en esta sección se presenta una visión consolidada de la ejecución del Plan Operativo Anual 2020 del **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ARCHIDONA**, en base al análisis de dos variables de la planificación: avance de las metas establecidas en cada uno de los Proyectos que son parte de los POAs de cada dependencia y; un análisis general del comportamiento presupuestario, a fin de contextualizar de mejor manera la Gestión Institucional.

6. DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Cada gobierno autónomo descentralizado realizará el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas de resultado y/o gestión y a la implementación de las intervenciones contenidas en el plan de desarrollo y en concordancia con la propuesta de ordenamiento territorial que, de acuerdo a la estructura programática, permitirán evidenciar los avances para la consecución del modelo territorial deseado.

6.1 EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

6.1.1 CONCEPTOS

Seguimiento. - Comprende la recolección y análisis de información realizados con regularidad, para contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones, garantizar la responsabilidad y sentar las bases de la evaluación y el aprendizaje. Proporciona información para verificar la realización progresiva, física y financiera de las intervenciones, así como su avance y resultados, en el marco de la planificación para el desarrollo y el ordenamiento territorial, con el fin de retroalimentar las políticas públicas a nivel local y nacional.

Evaluación. - Consiste en la valoración objetiva de los efectos de las intervenciones o políticas públicas enmarcadas en los procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, sobre la base de su situación actual, de la cual se desprenden juicios críticos sobre el diseño, ejecución u operación de sus estrategias e intervenciones, con la finalidad de identificar nudos críticos y establecer planes de acción.

Indicador. - Es una expresión matemática que sintetiza la información esencial relacionada con un fenómeno que ocurre en cierto momento y en un determinado espacio. Permite medir el cumplimiento de los objetivos y de las metas descritas en los Planes de Desarrollo.

Metas. - Son estimaciones cuantitativas de lo que se busca alcanzar en un período definido, sean estos impactos, efectos o productos. Se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo. Se establecen o plantean a partir de los indicadores seleccionados y en


concordancia a las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno. Para la construcción de una meta se requerirán, al menos, dos puntos o valores del indicador y comprometer a las instancias responsables en la recolección y entrega de información de los puntos en años futuros.

Proyecto. - Conjunto de actividades organizadas y estructuradas dentro de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupadas para cumplir con un propósito específico y contribuir a la solución de un problema, vinculadas a las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno.

6.1.2 ALCANCE DE LOS PROYECTOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDYOT)

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, desarrollarán estrategias, programas y proyectos para lograr el cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que les permita verificar la implementación, avance y resultados de su Planificación, a fin de identificar las causas y consecuencia del incumplimiento de las metas o la demora en el cronograma de ejecución de las intervenciones.

Gráfico 1. Modelo de Seguimiento y Evaluación al PDYOT

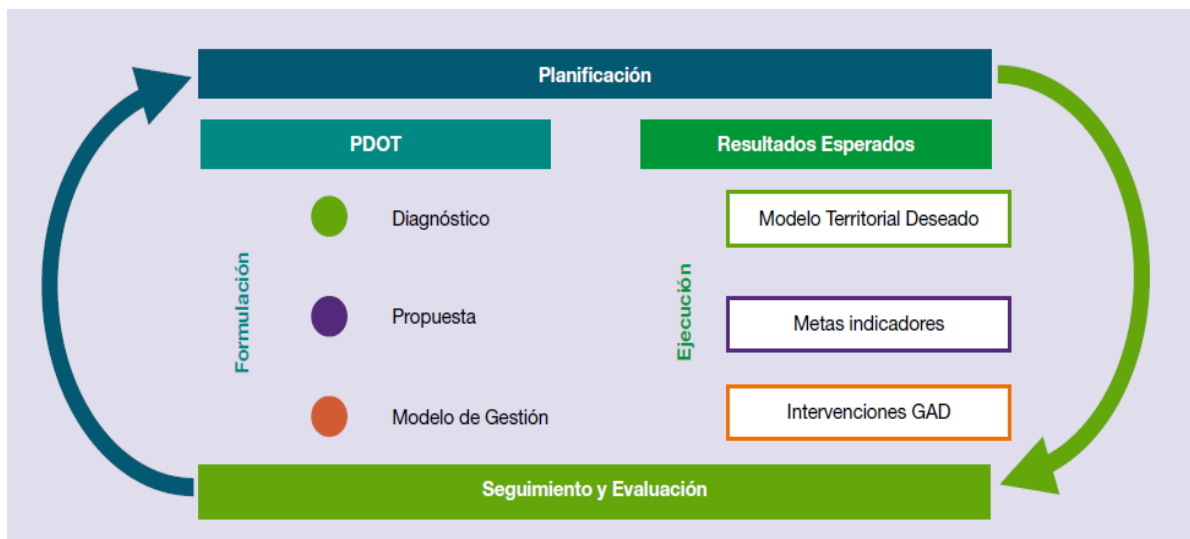

6.1.3 ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS:


Consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o proyectos; y los valores devengados para el mismo período.

6.1.4 ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS:

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo período, según las siguientes categorías:

De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así:

- ✓ Cumplida (●): indicador cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan al valor esperado en la anualización.
- ✓ Parcialmente Cumplida (◐): se establece lo siguiente
 1. Que el recurso se encuentra comprometido, y el proyecto ya esta para ejecutarse.
 2. Que el recurso se esta pagando por planillas hasta completar el pago total.
- ✓ Incumplida (◑): se establece que el proyecto se ha afectado por algún traspaso de fondos y se encuentra sin recursos.

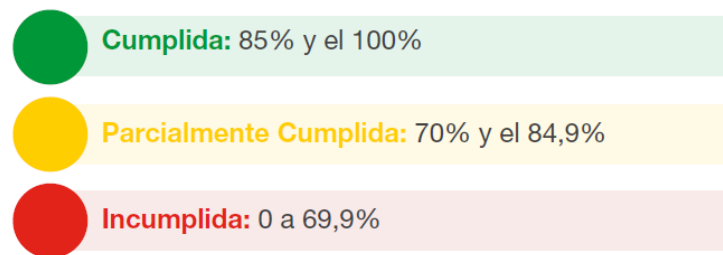


7. RESUMEN GENERAL DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EN LA MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA

Esto permite tener un enfoque resumido, en donde se encuentran distribuidos los proyectos – obras que se han planteado para su ejecución en el año fiscal 2020

7.1 RESUMEN FINANCIERO

En el siguiente cuadro y grafico se muestra el monto asignado a las distintas Direcciones para la ejecución de Proyectos se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

RESUMEN GENERAL					
RESUMEN FINANCIERO					
DIRECCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	VALOR ACTUAL	COMPROMETIDO	PAGADO
DIRECCION DE TURISMO	\$350.381,13	-\$170.797,34	\$179.583,79	\$101.520,98	\$89.793,99
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$133.146,47	\$70.143,50	\$203.289,97	\$1.198,40	\$1.198,40
PROYECTOS CONVENIO MIES	\$1.344.494,04	\$30.080,39	\$1.374.574,43	\$804.827,27	\$795.953,47
DIRECCION DE PLANIFICACION	\$352.288,72	-\$7.000,60	\$202.539,12	\$235.144,72	\$182.298,11
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	\$2.375.592,18	-\$590.675,22	\$1.784.917,05	\$959.470,93	\$845.646,97
DIRECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$2.494.548,06	\$381.882,41	\$2.123.548,10	\$1.675.783,89	\$1.416.910,96
CTEA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA (ALCANTARILLADO)	\$0,00	\$2.480.427,44	\$2.480.427,44	\$0,00	\$0,00
RECURSO DE LA CTEA PARA LA EMERGENCIA SANITARIA	\$0,00	\$85.182,54	\$85.182,54	\$85.182,53	\$85.182,53
RECURSOS DEL GADMA PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA	\$0,00	\$318.970,02	\$278.023,94	\$271.555,77	\$271.555,77
TOTAL GENERAL PARA PROYECTOS DEL AÑO 2020	\$7.050.450,60	\$2.598.213,14	\$8.712.086,38	\$4.134.684,49	\$3.688.540,20

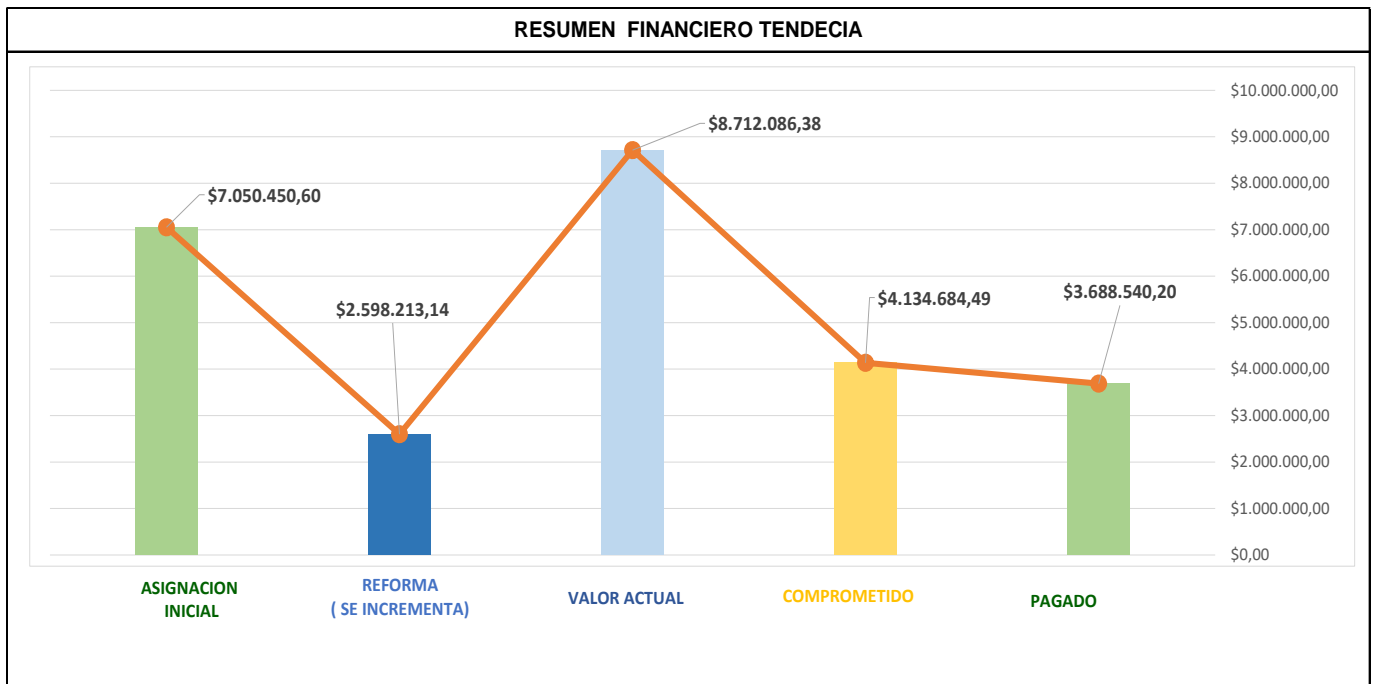


7.2 RESUMEN DE PROYECTOS

En el siguiente cuadro y grafico se muestra los proyectos en las distintas Direcciones para la ejecución de Proyectos se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

RESUMEN GENERAL DE LOS PROYECTOS				
RESUMEN DE PROYECTOS				
DIRECCION	CUMPLIDOS	PAR. CUMPLIDOS	INCUMPLIDOS	SIN EJECUTAR
DIRECCION DE TURISMO	7	5	7	-
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2	2	4	4
PROYECTOS CONVENIO MIES	-	6	-	-
DIRECCION DE PLANIFICACION	4	4	2	-
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32	6	8	-
DIRECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	14	5	1	3
RECURSO DE LA CTEA PARA LA EMERGENCIA SANITARIA	5	-	-	-
RECURSOS DEL GADMA PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA	17	-	-	-
PROYECTOS DEL AÑO 2020	81	28	22	7
TOTAL GENERAL DE PROYECTOS DEL AÑO 2020	138			

CUMPLIDO	81	59%
PAR.CUMPLIDO	28	20%
INCUMPLIDO	22	16%
SIN EJECUTAR	7	5%
TOTAL GENERAL DE PROYECTOS DEL AÑO 2020	138	100%

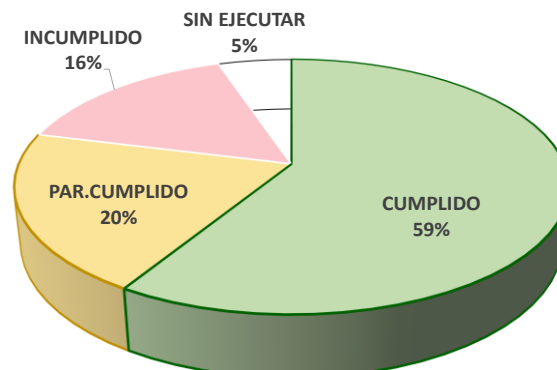

8. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 POR DIRECCIÓN

Esta sección presenta el avance o cumplimiento de los POAs por Direcciones, en base al análisis de dos variables: Porcentaje de cumplimiento promedio de las metas establecidas en cada uno de los Proyectos de las dependencias del Sector y, ejecución presupuestaria por dependencia, que incluye Recursos Municipales.

8.1 DIRECCIÓN DE TURISMO PROYECTOS

<p>● Cumplido: 85% y el 100%</p> <p>● Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%</p> <p>● Incumplido: 0 a 69,9%</p>	<p>DIRECCION DE TURISMO PROYECTOS 2020 ALCANZE DE LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDYT</p>
---	--

DIRECCION DE TURISMO

COMPONENTE: ECONOMICO PRODUCTIVO		OBJETIVO ESTRATEGICO : IMPULSAR LA REACTIVACION ECONOMICA ATRAVES DEL TURISMO SOSTENIBLE Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTON ARCHIDONA, A FIN DE POTENCIALIZAR LOS INGRESOS											
POLITICA: PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y GENERADORAS DE VALOR AGREGADO PARA IMPULSAR LA ECONOMIA DEL CANTON Y ASI DIVERSIFICAR LOS INGRESOS DE LA POBLACION					META: INCREMENTAR LOS RECURSOS QUE GENERA LA ACTIVIDAD TURISTICA PARA EL CANTÓN ARCHIDONA AUMENTANDO LA CANTIDAD DE VISITANTES A 81.996 PERSONAS HASTA EL AÑO 2024, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN ENROLADA EN ESTE SECTOR, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y CULTURA MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES, FERIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y EMPRENDIMIENTOS, LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO								
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.3.02.05.001	Festival Patrimonial Intercultural y Turístico de la Chonta	\$120.000,00	-\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	NUMERO	14875	18000	121%	INCUMPLIDO	R.3.TRASP.CARNAVAL R.9.EMER.SANIT.
7.3.02.05.002	Promoción Cultural	\$8.000,00	-\$8.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.9.EMER.SANIT.
7.3.02.05.003	Promoción Cultural Homenaje Al Líder Histórico Jumandy	\$5.000,00	-\$1.000,00	\$4.000,00	\$3.990,00	\$3.990,00	100%					CUMPLIDO	-
7.3.02.05.004	Promoción Cultural (fin de año)	\$5.000,00	-\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.9.EMER.SANIT.
7.3.02.05.005	Promoción al Turismo Cultural Gastronómico.Deportivo. Recreativo del	\$17.400,00	\$12.600,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	100%					CUMPLIDO	-
7.3.02.05.006	Fomento al Deporte recreativo	\$25.946,40	-\$25.946,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.26.RESL.CONSI.MUN.RESL.185
7.3.02.49.002	Impulso Al Fomento Productivo, Acorde A La Economía Popular Y Solidaria	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.199,99	100%					CUMPLIDO	-
7.3.02.49.003	Participación en Ferias de Turismo, locales y Nacionales	\$8.000,00	-\$8.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.26. PAG.JUBI-LIQU-M.1123.1-DDO-GADMA-2020
7.3.02.49.006	Promoción Y Difusión Cultural Y Turístico Del Cantón Archidona	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	100%					CUMPLIDO	-
7.3.02.49.007	Festival Internacional del Patrimonio Intercultural	\$8.000,00	\$0,00	\$8.000,00	\$8.000,00	\$8.000,00	100%					CUMPLIDO	-
73.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	\$10.000,00	\$1.306,40	\$11.306,40	\$11.306,40	\$11.306,40	100%					CUMPLIDO	-
73.08.11	Adquisición de Carpas	\$10.000,00	\$5.577,59	\$15.577,59	\$15.274,56	\$5.297,60	35%					CUMPLIDO	-
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	\$20.000,00	-\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.9.EMER.SANIT.

COMPONENTE: ECONOMICO PRODUCTIVO		OBJETIVO ESTRATEGICO : IMPULSAR LA REACTIVACION ECONOMICA ATRAVES DEL TURISMO SOSTENIBLE Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTON ARCHIDONA, A FIN DE POTENCIALIZAR LOS INGRESOS											
POLITICA: PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y GENERADORAS DE VALOR AGREGADO PARA IMPULSAR LA ECONOMIA DEL CANTON Y ASI DIVERSIFICAR LOS INGRESOS DE LA POBLACION					META: ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO CULTURAL DEL CANTÓN ARCHIDONA EN EL CUAL SE ESTABLEZCAN LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DEL SECTOR TURISTICO EN EL CANTÓN HASTA 2021.								
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.3.06.01.015	Consultoría Para La Elaboración Del Plan Estratégico Cultural Del Cantón	\$47.834,73	-\$946,76	\$46.887,97	\$0,00	\$0,00	0%	NUMERO	1	0,17	0,50%	PAR. CUMPLIDO	-
7.3.06.01.016	Consultoría Para La Actualización Del Plan Estratégico Para El Desarrollo	\$0,00	\$24.508,96	\$24.508,96	\$0,00	\$0,00	0%					PAR. CUMPLIDO	-
8.4.04.04	Fortalecimiento del turismo mediante la aprobación y difusión de los atractivos turísticos, utilizando plataforma de página Web	\$24.000,00	-\$17.647,15	\$6.352,85	\$0,00	\$0,00	0%					PAR. CUMPLIDO	-

COMPONENTE: ECONOMICO PRODUCTIVO		OBJETIVO ESTRATEGICO : IMPULSAR LA REACTIVACION ECONOMICA ATRAVES DEL TURISMO SOSTENIBLE Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTON ARCHIDONA, A FIN DE POTENCIALIZAR LOS INGRESOS											
POLITICA: PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y GENERADORAS DE VALOR AGREGADO PARA IMPULSAR LA ECONOMIA DEL CANTON Y ASI DIVERSIFICAR LOS INGRESOS DE LA POBLACION					META: CONTAR CON 500 PERSONAS TECNIFICADAS Y CAPACITADAS EN TEMAS DE PRODUCCIÓN EMPRENDIMIENTO, ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN O SIMILARES HASTA EL 2024								
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
73.06.13	Capacitación Para La Ciudadanía En General	\$10.000,00	-\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	NUMERO	140	40	0%	INCUMPLIDO	R.9.EMER.SANIT.

COMPONENTE: SOCIAL CULTURAL		OBJETIVO ESTRATEGICO : PROMOVER UN MARCO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL Y POLÍTICO QUE PROPICIE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA INTERCULTURALIDAD, IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL											
POLITICA: INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD					META: AMPLIAR EN 20% LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA HASTA EL 2024.								
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.3.14.08	Bienes Artísticos Y Culturales	\$0,00	\$798,02	\$798,02	\$798,02	\$0,00	0%	PORCENTAJE	74%	74%	100%	PAR. CUMPLIDO	-
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	\$0,00	\$952,00	\$952,00	\$952,00	\$0,00	0%					PAR. CUMPLIDO	-


TOTAL GENERAL	\$350.381,13	-\$170.797,34	\$179.583,79	\$101.520,98	\$89.793,99	88%
----------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-------------	-----

8.2 DIRECCIÓN DE TURISMO ANÁLISIS ECONÓMICO

ESTADISTICO GRAFICO DIRECCION DE TURISMO


DIRECCION DE CULTURA ANALISIS DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS 2020

CUMPLIDO	7	37%
PAR.CUMPLIDO	5	26%
INCUMPLIDO	7	37%
# TOTAL DE PROYECTOS	19	100%

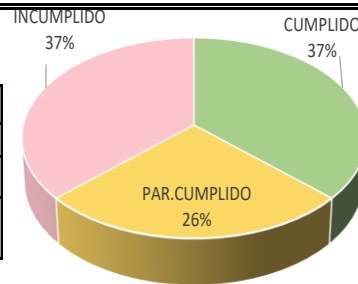

DIRECCION DE CULTURA ANALISIS ECONOMICA DE LOS PROYECTOS 2020

ANALISIS ECONOMICO

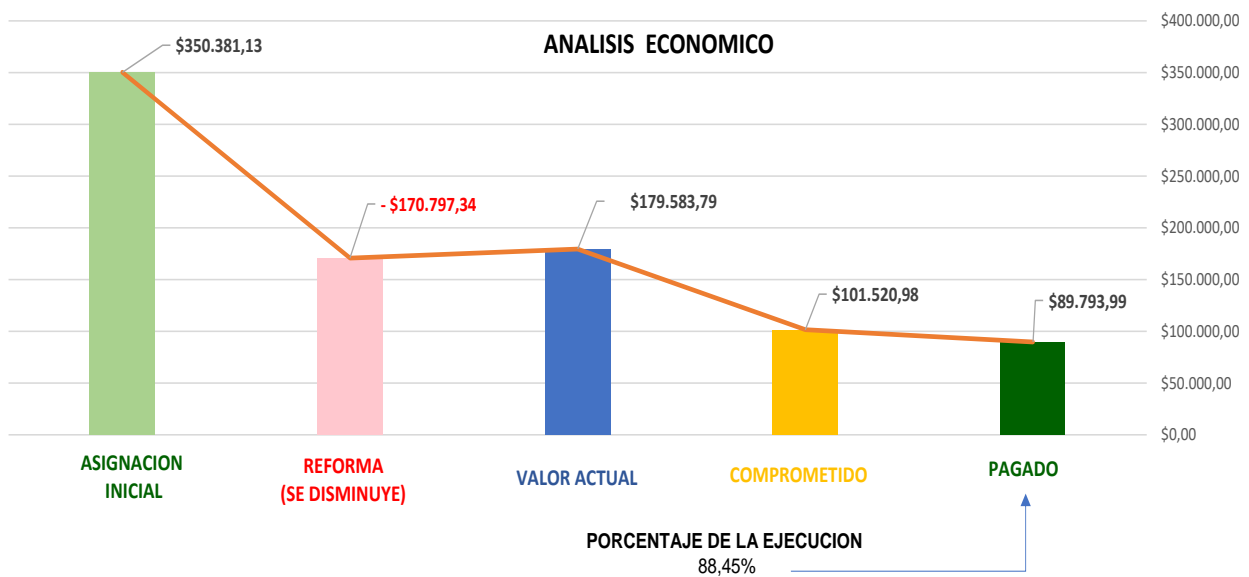

8.3 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL – MIES PROYECTOS.

<p>● Cumplido: 85% y el 100%</p> <p>● Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%</p> <p>● Incumplido: 0 a 69,9%</p>	<p>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 2020 ALCANZE DE LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDYOT</p>
---	---

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

COMPONENTE: SOCIO CULTURAL		OBJETIVO ESTRATEGICO : PROMOVER UN MARCO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL Y POLÍTICO QUE PROPICIE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA INTERCULTURALIDAD, IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL											
POLITICA: PROMOVER LOS PRINCIPIOS DE INCLUSION SOCIAL, EQUITAD Y GENERO EN TODOS LOS NIVELES SOCIOCULTURALES DEL CANTÓN.		META: INCREMENTAR A 273 PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROPIOS Y MEDIANTE CONVENIO CON OTRAS INSTITUCIONES HASTA EL 2024.											
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
73.01.05	Proyecto de implementación zona wifi para Parroquia San Pablo	\$0,00	\$8.953,94	\$8.953,94	\$0,00	\$0,00	0%	NUMERO	1038	500	48%	PARCIALMETE	-
73.06.13	Capacitación para la ejecución de desarrollo artesanal en el Cantón Archidona	\$4.200,00	\$1.800,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	0%					SIN EJECUTAR	-
7.3.02.05.007	Proyecto Mushuk Rãmpi Purik Wawakuna	\$5.000,00	-\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R. 10 FINANCIAMIENTO PARA LA DEVOLUCION DEL RECURSO NO EJECUTADOS CONVENIO MIES GADMA 2020 MIES
7.3.02.05.008	Proyecto 16 días de activismo	\$2.000,00	-\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R. 10 FINANCIAMIENTO PARA LA DEVOLUCION DEL RECURSO NO EJECUTADOS CONVENIO MIES GADMA 2020 MIES
7.3.02.05.009	Promoción Y Garantía De Derechos De La Mujer Y La Familia	\$2.000,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	0%					SIN EJECUTAR	-
7.3.08.11	Adquisición de materiales para el proyecto de implementación zona wifi para la parroquia de San Pablo	\$935,50	-\$425,40	\$510,10	\$0,00	\$0,00	0%					PARCIALMETE	-
7.3.08.25	Ayudas Técnicas Para Compensar Discapacidades	\$17.766,97	-\$17.766,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.32 FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENT.ZONA.WIFI.P.SAN.PABLO
84.01.05	Adquisición de un bus para la movilización de las personas de atención prioritaria del canton Archidona	\$90.544,00	\$90.781,93	\$181.325,93	\$0,00	\$0,00	0%					CUMPLIDO	-
222.73.05.02	edificios locales y residencias	\$300,00	\$0,00	\$300,00	\$0,00	\$0,00	0%					SIN EJECUTAR	-
222.73.06.03	Servicio de capacitación	\$9.200,00	-\$9.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.29.RESL.CONSI.MUN.RESL.185
222.73.06.13	Capacitación para la ciudadanía en general	\$0,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	0%					SIN EJECUTAR	-
222.73.08.07	Materiales de impresión	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00	\$1.198,40	\$1.198,40	100%					CUMPLIDO	-
TOTAL I		\$133.146,47	\$70.143,50	\$203.289,97	\$1.198,40	\$1.198,40	1%						

CONVENIOS MIES


COMPONENTE: SOCIO CULTURAL		OBJETIVO ESTRATEGICO : PROMOVER UN MARCO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL Y POLÍTICO QUE PROPICIE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA INTERCULTURALIDAD, IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL											
POLITICA: PROMOVER LOS PRINCIPIOS DE INCLUSION SOCIAL, EQUITAD Y GENERO EN TODOS LOS NIVELES SOCIOCULTURALES DEL CANTÓN.		META: INCREMENTAR A 273 PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROPIOS Y MEDIANTE CONVENIO CON OTRAS INSTITUCIONES HASTA EL 2024.											
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
223	Centros gerontologicos de atencion diurna	\$158.857,01	\$66.080,13	\$224.937,14	\$124.877,89	\$124.750,43	100%	NUMERO	1038	62	6%	CUMPLIDO	
224	Adultos mayores atencion dom. Sin discapacidad	\$12.386,44	\$3.314,25	\$15.700,69	\$11.172,48	\$11.172,48	100%	NUMERO		34	3%	CUMPLIDO	
225	Adultos mayores atencion dom. Con discapacidad	\$45.419,71	\$14.427,32	\$59.847,03	\$41.224,60	\$41.224,60	100%	NUMERO		57	5%	CUMPLIDO	
226	Adultos May. Modalid. Socializ Y Encuentro	\$96.643,93	-\$24.342,54	\$72.301,39	\$50.473,66	\$50.394,11	100%	NUMERO		129	12%	CUMPLIDO	
227	A H C Personas Con Discapacidad	\$61.093,42	\$1.848,10	\$62.941,52	\$56.893,58	\$56.893,58	100%	NUMERO		120	12%	CUMPLIDO	
228	Centros De Desarrollo Infantil	\$970.093,53	-\$31.246,87	\$938.846,66	\$520.185,06	\$511.518,27	98%	NUMERO		496	48%	CUMPLIDO	
TOTAL II		\$1.344.494,04	\$30.080,39	\$1.374.574,43	\$804.827,27	\$795.953,47	99%						

META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META GLOBAL ALCANZADA 2020	META GLOBAL ALCANZADA EN PORCENTAJE
1038	1398	135%


TOTAL GENERAL	\$1.477.640,51	\$100.223,89	\$1.577.864,40	\$806.025,67	\$797.151,87	99%
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------

8.4 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL – MIES (ANÁLISIS ECONÓMICO).


ESTADISTICO GRAFICO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

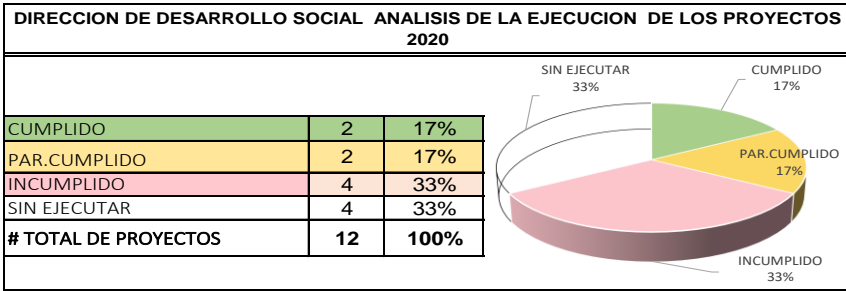


DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ANALISIS ECONOMICA DE LOS PROYECTOS 2020

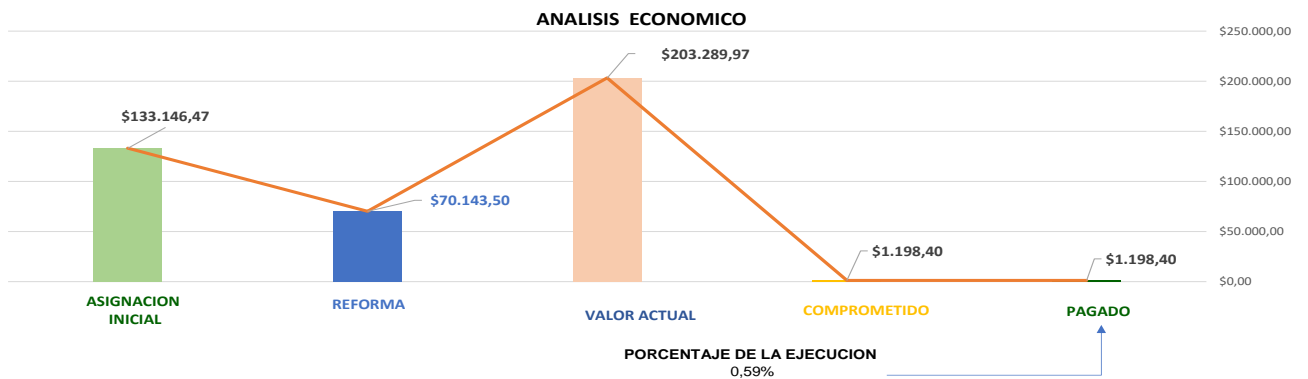

ESTADISTICO GRAFICO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL -MIES



DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL -MIES ANALISIS ECONOMICA DE LOS PROYECTOS 2020

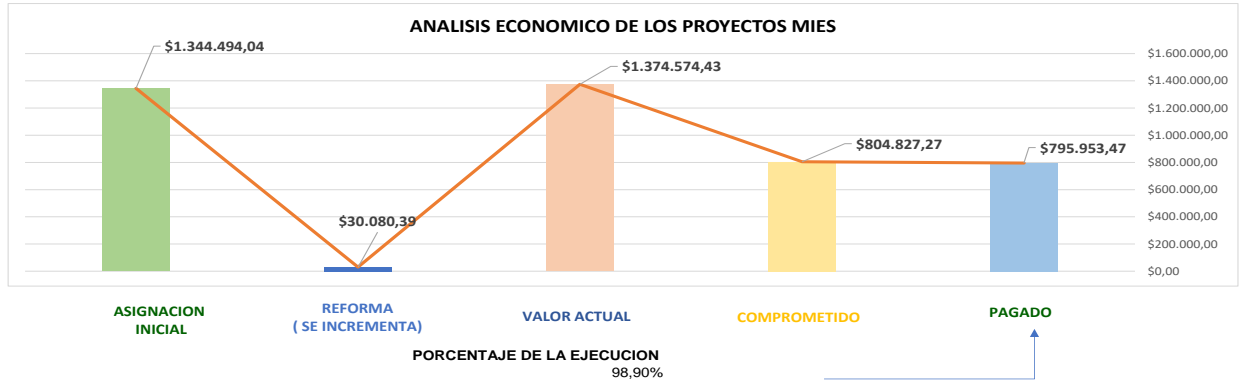

8.5 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PROYECTOS.

<p>Cumplido: 85% y el 100%</p> <p>Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%</p> <p>Incumplido: 0 a 69,9%</p>	<h2>DIRECCION DE PLANIFICACION 2020</h2> <h3>ALCANZE DE LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDYOT</h3>
---	--

DIRECCION DE PLANIFICACION

COMPONENTE: POLITICO INSTITUCIONAL		OBJETIVO ESTRATEGICO: CONTAR CON MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ACTORES CANTONALES, LOS CUALES PUEDAN ESTAR ORGANIZADOS, EMPODERADOS Y RECONOCIDOS LEGALMENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES CON SUS GOBERNANTES A FAVOR DE LA COMUNIDAD CANTONAL											
POLITICA: DESARROLLAR UN PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL HASTA EL AÑO 2024 QUE PERMITA MEJORAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		META: CONTAR CON HERRAMIENTAS, METODOLOGÍAS Y ESPACIOS QUE GARANTICEN UN ESPACIO DE INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y GOBERNABILIDAD DE MANERA INTEGRAL ENTRE LOS PODERES DE LA CIUDADANÍA, ESTADO, Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES HASTA EL 2024, A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA DE 27 MESAS DE DIÁLOGO VIRTUALES-PRESENCIALES (3 POR AÑO)											
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
73.06.01.006	PROYECTO CASTASTRO RURAL	\$142.749,00	\$0,00	\$0,00	\$142.749,00	\$141.636,00	99%	NUMERO	6	11	183%	CUMPLIDO	-
7.3.02.05.017	Participación Ciudadana, Socializaciones Y Asambleas Comunitarias	\$5.998,91	-\$3.000,00	\$2.998,91	\$2.998,91	\$2.998,91	100%					CUMPLIDO	-
7.3.06.01.005	Actualización Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial	\$60.000,00	\$8.960,00	\$68.960,00	\$68.960,00	\$17.240,00	25%					PAR CUMPLIDO	-
7.3.06.01.006	Contratación del sistema de información Local	\$15.000,00	-\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.29.RESL. CONSI. MUN. R. ESI. 185

COMPONENTE: BIOFISICO		OBJETIVO ESTRATEGICO: CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL IRREPETIBLE DE LA ZONA, A TRAVÉS DEL AUMENTO DE CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDÉMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN ARCHIDONA.											
POLITICA: IMPULSAR LAS CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDÉMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		META: FORTALECER LOS PROCESOS PARA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, A FIN DE QUE EL 100% DE LOS PROYECTOS QUE OPERAN EN EL CANTÓN ARCHIDONA, CUENTEN CON UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SU RESPECTIVA LICENCIA, HASTA 2024.											
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.3.06.05.028	Estudio(Parque Lineal Ambiental Boulevard- Sinchi Sacha Y Plaza	\$93.104,00	-\$144,00	\$92.960,00	\$0,00	\$0,00	0%	PORCENTAJE	1	1,5	150%	PAR CUMPLIDO	-
7.3.06.05.030	Estudio De Suelo En Los Terrenos Del Miduvi Archidona. Para La	\$0,00	\$6.238,40	\$6.238,40	\$0,00	\$0,00	0%					PAR CUMPLIDO	-

TOTAL I	\$316.851,91	-\$2.945,60	\$171.157,31	\$214.707,91	\$161.874,91	75%
----------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------


COORDINACION DE TRANSITO

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS		OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTABLECER UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ESTRUCTURADO, PLANIFICADO Y SOSTENIBLE QUE APORTE AL DESARROLLO DE NUEVOS POLOS DE DESARROLLO EN LAS ÁREAS RURALES MEDIANTE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO, PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN ARCHIDONA.											
POLITICA: GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO		META: CUMPLIR CON EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN ARCHIDONA PARA LLEGAR A UN 60% DE COBERTURA DE LAS NECESIDADES HASTA 2024.											
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
73.06.05.008	Estudio de direccionalidad de vias en el Canton Archidona y sus parroquias	\$15.000,00	-\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	PORCENTAJE	28%	13,9%	50%	INCUMPLIDO	R.29.RESL. CONSI. MUN. R. ESI. 185
7.3.06.05.009	Ejecución Del Proceso De Autotutela Legalidad Y Corrección De	\$0,00	\$10.945,00	\$10.945,00	\$0,00	\$0,00	0%					PAR CUMPLIDO	-
7.5.05.01.006	Señalización Vial Horizontal Y Vertical En La Vía E45 Del Sector Urbano Dle	\$20.436,81	\$0,00	\$20.436,81	\$20.436,81	\$20.423,20	100%					CUMPLIDO	-

TOTAL II	\$35.436,81	-\$4.055,00	\$31.381,81	\$20.436,81	\$20.423,20	100%
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

TOTAL GENERAL	\$352.288,72	-\$7.000,60	\$202.539,12	\$235.144,72	\$182.298,11	78%
----------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------

8.6 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO.

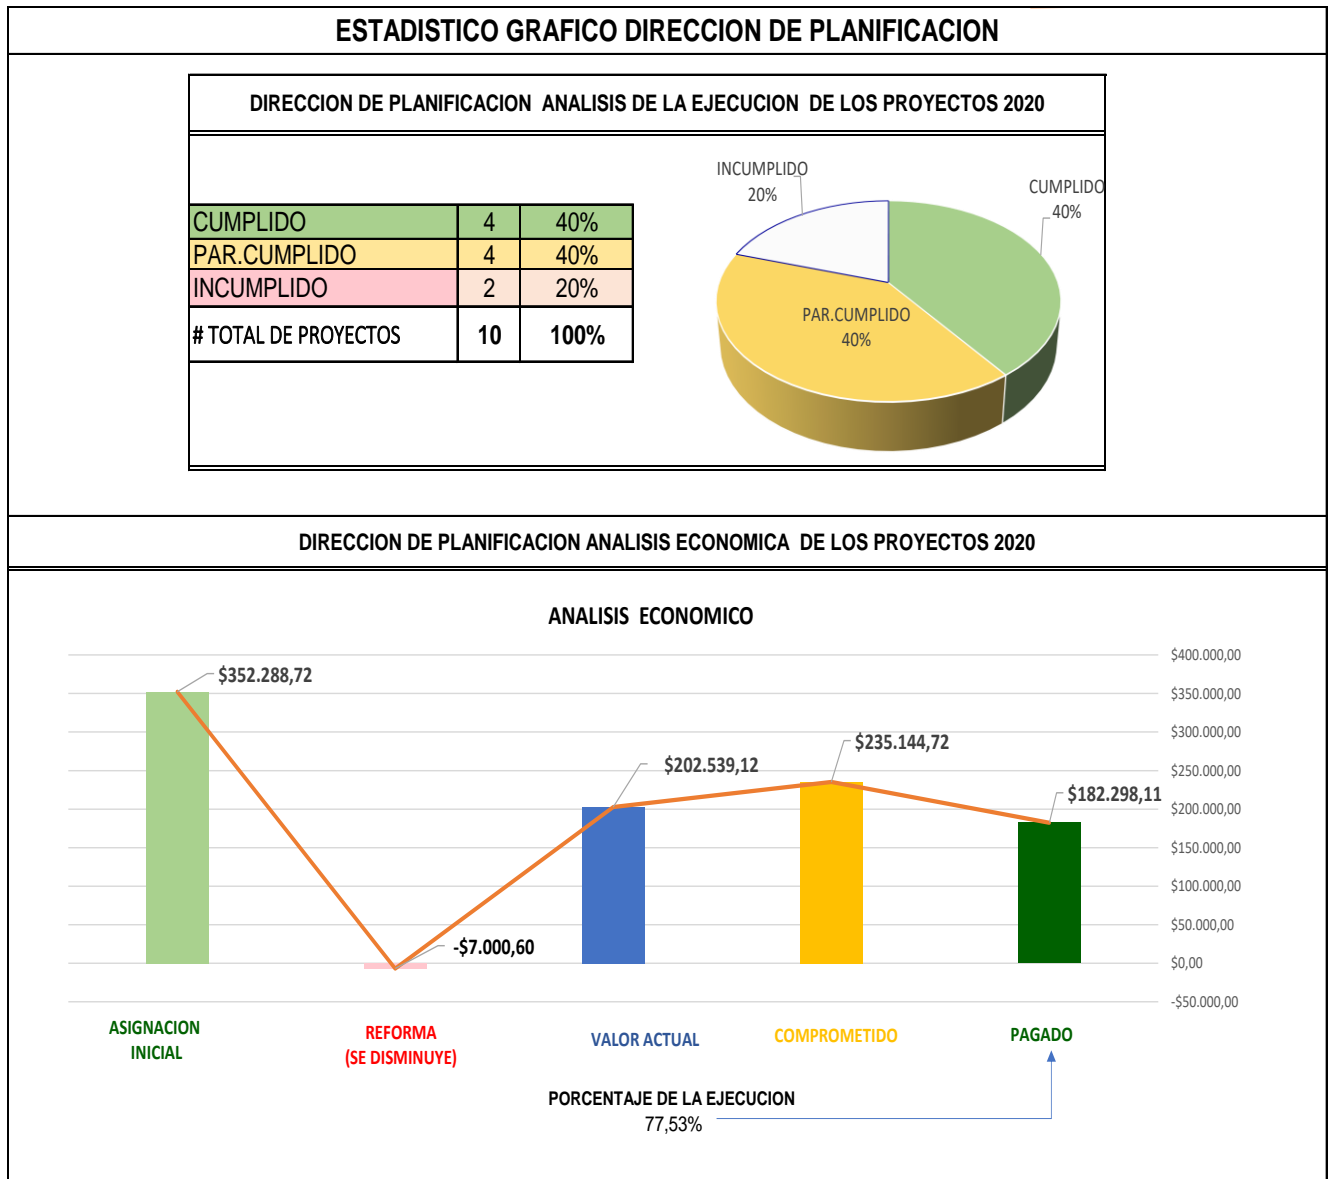

8.7 DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA PROYECTOS.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 20%;"> <p>● Cumplido: 85% y el 100%</p> <p>● Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%</p> <p>● Incumplido: 0 a 69,9%</p> </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2020 ALCANZE DE LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDYOT</p> </div> </div>													
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA													
COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS		OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTABLECER UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ESTRUCTURADO, PLANIFICADO Y SOSTENIBLE QUE APORTE AL DESARROLLO DE NUEVOS POLOS DE DESARROLLO EN LAS ÁREAS RURALES MEDIANTE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO, PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN ARCHIDONA.											
POLITICA: GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO					META: READECUAR 12 ESPACIOS COMUNITARIOS, Y/O RURALES, PARA ACTIVIDADES DE ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN ARCHIDONA POR AÑO ,HASTA 2023.								
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.5.01.07.001	Remodelación del ex-subcentro de Salud para la Dirección Social Gadma	\$120.000,00	-\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	NUMERO	31	1	3%	INCUMPLIDO	R.29.RESL.CONSEJ.MU N.RESL.185
7.5.01.07.059	Construcción Mercado Artesanal	\$139.720,00	-\$139.720,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.60 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL
7.5.05.01.044	Adecantamiento Casa Comunal De Ita Quivilina	\$0,00	\$3.045,80	\$3.045,80	\$2.870,17	\$2.870,17	100%					CUMPLIDO	-
7.8.01.03.001	Convenio Gadma- Empresa Eléctrica	\$0,00	\$3.179,50	\$3.179,50	\$3.179,50	\$0,00	0%					PAR. CUMPLIDO	-
7.3.08.11	Adquisición de 3 moladoras y materiales de construcción para el proyecto de aceras y bordillos	\$86.507,00	\$0,00	\$86.507,00	\$86.507,00	\$0,00	0%					PAR. CUMPLIDO	-
TOTAL I		\$346.227,00	-\$253.494,70	\$92.732,30	\$92.556,67	\$2.870,17	3%						

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESTABLECER UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ESTRUCTURADO, PLANIFICADO Y SOSTENIBLE QUE APORTE AL DESARROLLO DE NUEVOS POLOS DE DESARROLLO EN LAS ÁREAS RURALES MEDIANTE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO, PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN ARCHIDONA.
POÍTICA: GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO	META: READECUAR 12 ESPACIOS COMUNITARIOS, Y/O RURALES, PARA ACTIVIDADES DE ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN ARCHIDONA POR AÑO ,HASTA 2023.

PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.3.06.05.029	Servicio de realización de ensayos y perforaciones geotécnicas, sin interpretaciones de la avenida napo, cantón archidona, provincia de napo	\$0,00	\$6.052,48	\$6.052,48	\$6.052,48	\$6.052,48	100%					CUMPLIDO	-
7.3.04.02	Mantenimiento, remodelación y equipamiento del auditorio municipal del canton archidona	\$44.727,48	-\$20.000,00	\$24.727,48	\$24.727,48	\$24.396,86	99%					CUMPLIDO	-
7.5.01.07.018	Ampliación De La Cubierta En La Unidad Educativa María Inmaculada-Educación	\$0,00	\$17.560,00	\$17.560,00	\$0,00	\$0,00	0%					CUMPLIDO	-
7.5.01.07.060	Paradas De Buses Sector Rural Y Urbano	\$12.173,00	-\$12.173,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.17-29
7.5.01.07.061	Construcción De Una Cancha Cubierta Con Tubería De Petróleo en Lushianta de San Pablo	\$113.702,65	\$0,00	\$113.702,65	\$113.702,65	\$113.671,86	100%					CUMPLIDO	-
7.5.01.07.062	Construcción De Un Galpón Con Tubería De Petróleo En El Mercado	\$121.817,14	-\$11.968,48	\$109.848,66	\$109.848,66	\$101.186,64	92%					CUMPLIDO	-
7.5.01.07.063	Construcción Del Archivo General Del Gadma	\$40.000,00	-\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.6-29
7.5.01.07.064	Construcción de escenario y graderío cerramiento en la cancha de uso múltiple con tubería de petróleo en la comunidad de wawa sumaco , parroquia hatun sumaco del cantón archidona	\$0,00	\$88.731,00	\$88.731,06	\$0,00	\$0,00	0%					PAR. CUMPLIDO	-
7.5.01.99.001	Construcción de alcantarillas y muros	\$50.000,00	-\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.23-29
7.5.05.01.008	Mantenimiento De Obras	\$114.835,28	\$148.469,45	\$263.304,76	\$130.487,25	\$121.938,56	93%					CUMPLIDO	-
	ADECT.CASA.COMN.COMN.NARUPA					\$3.558,32	100%					CUMPLIDO	-
	MANT.PILETAS.PARQ.13.ABRIL					\$27.650,26	100%					CUMPLIDO	-
	CONTR.MANT.REPA.Y.ADEC.DE LAS INST.EX-CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL					\$7.864,05	100%					CUMPLIDO	-
	MANT.CASA.COMEDOR.COMUN.PUNGURAYACU					\$4.072,88	100%					CUMPLIDO	-
	ADEC.CASA.GEST.COMUN.KURY-MUYUP.SAN PABLO					\$7.470,90	100%	NUMERO	31	36	116%	CUMPLIDO	-
	ADEC.PINT.EXTERIOR.CERRA.Y GRADERIO PRINCIPAL DEL ESTADIO AURELIO ESPINOSA					\$7.949,29	100%					CUMPLIDO	-
	ADEC.CASA COMUN.COMUN.YAGUARI URKU					\$14.824,59	100%					CUMPLIDO	-
	ADEC.CUBIERT.Y GRADERIOS.B. SAN AGUSTIN C. ARCHIDONA					\$7.219,72	100%					CUMPLIDO	-
	ADEC.Y PINTURA EN GRADERIOS DE LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMU.CHACABUMI.C.ARCHIDONA					\$2.775,72	100%					CUMPLIDO	-
	ADEC.Y AJARDENIMIENTO DEL CAMPO SANTO DE SANTA ELENE					\$7.887,60	100%					CUMPLIDO	-
	ADEC.CASA.GEST.COMUN.SAN DIEGO.P.ARCHIDONA					\$5.690,60	100%					CUMPLIDO	-
	ADEC.PINT.DEL BALNEARIO TURISTICO DEL CAPOA					\$6.929,77	100%					CUMPLIDO	-
	MANT.Y REPARACION CASA.COMUN.DE LA COMUNIDAD WAMAK URKU P.COYUNDO					\$5.884,44	100%					CUMPLIDO	-
	SEÑALIZACION HORIZ.VIA E-45 TRAMO REDONDEL.GASOLINERA SUR DEL CANTON ARCHIDONA					\$7.884,80	100%					CUMPLIDO	-
	ADEC.CASA COMUNAL-COMEDOR DE LA COMUNIDAD VILLANO P. SAN PABLO					\$4.275,62	100%					CUMPLIDO	-
7.5.05.01.011	Mantenimiento de Parques y Jardines	\$120.500,00	-\$120.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.29-40-41-47.
7.5.05.01.038	Adecantamiento De Casa Comunal Y Bateria Sanitaria De La Comunidad	\$6.295,10	-\$6.295,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	R.29-47.
8.4.01.04	liquidacion del contrato del tracto camion y cama baja	\$35.683,20	\$121.301,60	\$156.984,80	\$0,00	\$0,00	0%					CUMPLIDO	-
7.3.08.11	Insumos y materiales de construcción eléctricos, plomería y carpintería	\$122.296,01	\$17.289,17	\$139.585,18	\$109.657,23	\$109.657,23	100%					CUMPLIDO	-

REFORMAS

- R.6 TRASPASO-FIANACIA-AMPLIA-CANCHA CUABIERTA MARAI INMACULADA
- R.17 TRASPASO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA M. 398-DDO-GADMA-2020
- R.29 RESL. CONSI. MUN. RESL.185
- R.23 TRASPASO PARA EJECUTAR VARIOS PROYECTOS
- R.40 TRASPASO PARA ATENDER PROYECTOS
- R.47 TRASPASO PARA EJECUTAR PROYECTOS DE LA
- R.41 TRASPASO PARA PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
- R.22 LIQUIDACION PARA LA ADQUISICION DEL TRACTO


VIALIDAD

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS		OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTABLECER UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ESTRUCTURADO, PLANIFICADO Y SOSTENIBLE QUE APORE AL DESARROLLO DE NUEVOS POLOS DE DESARROLLO EN LAS ÁREAS RURALES MEDIANTE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO, PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN ARCHIDONA.														
POLITICA: GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO		META: CUMPLIR CON EL PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN ARCHIDONA PARA LLEGAR A UN 35% DE COBERTURA DE LAS NECESIDADES HASTA 2024.														
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020		META ALCANZADA 2020		META ALCANZADA EN PORCENTAJE		CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
									URBANO	RURAL	URBANO	RURAL	URBANO	RURAL		
7.5.01.04.015	Construcción de aceras y bordillos en barrios y parroquias del cantón archidona, provincia de napo	\$373.122,97	-\$120.000,00	\$253.122,97	\$0,00	\$0,00	0%	PORCENTAJE	27%	21%	76%	PAR. CUMPLIDO		-		
75.01.05.001	Asfaltado de las calles centricas de la ciudad	\$82.000,00	-\$82.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO		R.22-29.		
75.01.05.004	Construccion de obras de infraestructura vial	\$154.000,00	-\$146.173,18	\$7.826,82	\$7.826,82	\$7.826,82	100%					CUMPLIDO		-		
TOTAL II		\$1.391.152,83	-\$209.706,06	\$1.181.446,86	\$502.302,57	\$484.730,45	97%									

TALLERES Y MANTENIMIENTO

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS		OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTABLECER UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ESTRUCTURADO, PLANIFICADO Y SOSTENIBLE QUE APORE AL DESARROLLO DE NUEVOS POLOS DE DESARROLLO EN LAS ÁREAS RURALES MEDIANTE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO, PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN ARCHIDONA.															
POLITICA: GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO		META 1: RELIZAR LA INTERVENCION EN EL ESTADO DE LAS VIAS DE LA ZONA RURAL DEL CANTÓN ARCHIDONA, PARA AMPLIAR LA CONECTIVIDAD DE SERVICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN BENEFICIO EN UN 75% HASTA EL 2024.															
		META 2: RELIZAR LA INTERVENCION EN EL ESTADO DE LAS VIAS DE LA ZONA URBANAS DEL CANTÓN ARCHIDONA, PARA AMPLIAR LA CONECTIVIDAD DE SERVICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN BENEFICIO EN UN 75% HASTA EL 2024.															
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020		META ALCANZADA 2020		META ALCANZADA EN PORCENTAJE		CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA	
									URBANO	RURAL	URBANO	RURAL	URBANO	RURAL			
7.3.04.04	mantenimeintos de mano de obra de maquinaria municipal	\$102.951,44	-\$66.487,35	\$36.464,09	\$19.725,96	\$19.724,49	100%	PORCENTAJE	Q	60,4%	20,7%	48,5%	#IVALOR!	80,3%	CUMPLIDO		-
7.3.04.05	Adquisición de repuestos y mano de obra para mantenimiento preventivo de las camionetas	\$90.672,00	-\$85.200,99	\$5.471,01	\$4.642,33	\$4.642,33	100%								CUMPLIDO		-
7.3.05.04	Servicio de sistema de radio moviles	\$10.000,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	0%								PAR. CUMPLIDO		-
	Mantenimiento correctivos de los vehículos, maquinarias y equipos														PAR. CUMPLIDO		-
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	\$107.958,08	-\$5.741,63	\$102.216,45	\$84.258,37	\$84.258,37	100%								CUMPLIDO		-
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	\$106.383,09	\$0,00	\$106.383,09	\$100.242,99	\$94.260,40	94%								CUMPLIDO		-
7.3.08.11	Adquisición de insumos para soldadura del parque automotor, equipos y estructuras del gad Municipal de Archidona	\$23.417,57	-\$15.539,71	\$7.877,86	\$7.877,86	\$7.877,86	100%								CUMPLIDO		-
7.3.08.13	Adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo de la maquinaria Municipal	\$92.174,26	\$47.184,91	\$139.359,17	\$57.405,58	\$57.405,58	100%								CUMPLIDO		-
7.7.02.01	Póliza de seguros de incendio y alladas, robos y asalto, equipo eléctrico, vehículo, equipo y maquinaria	\$73.862,63	\$8.310,31	\$82.172,94	\$69.665,80	\$69.665,80	100%								CUMPLIDO		-
8.4.01.06	Adquisición de herramientas para la Municipalidad	\$30.793,28	-\$10.000,00	\$20.793,28	\$20.792,80	\$20.211,52	97%								CUMPLIDO		-
TOTAL III		\$638.212,35	-\$127.474,46	\$510.737,89	\$364.611,69	\$358.046,35	98%										
TOTAL GENERAL		\$2.375.592,18	-\$590.675,22	\$1.784.917,05	\$959.470,93	\$845.646,97	88%	META PLANIFICADA DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS COMUNITARIOS 2020		META ALCANZADA DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS COMUNITARIOS 2020		META ALCANZADA EN PORCENTAJE					
								31		37		119%					

8.8 DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA ANÁLISIS ECONÓMICO.

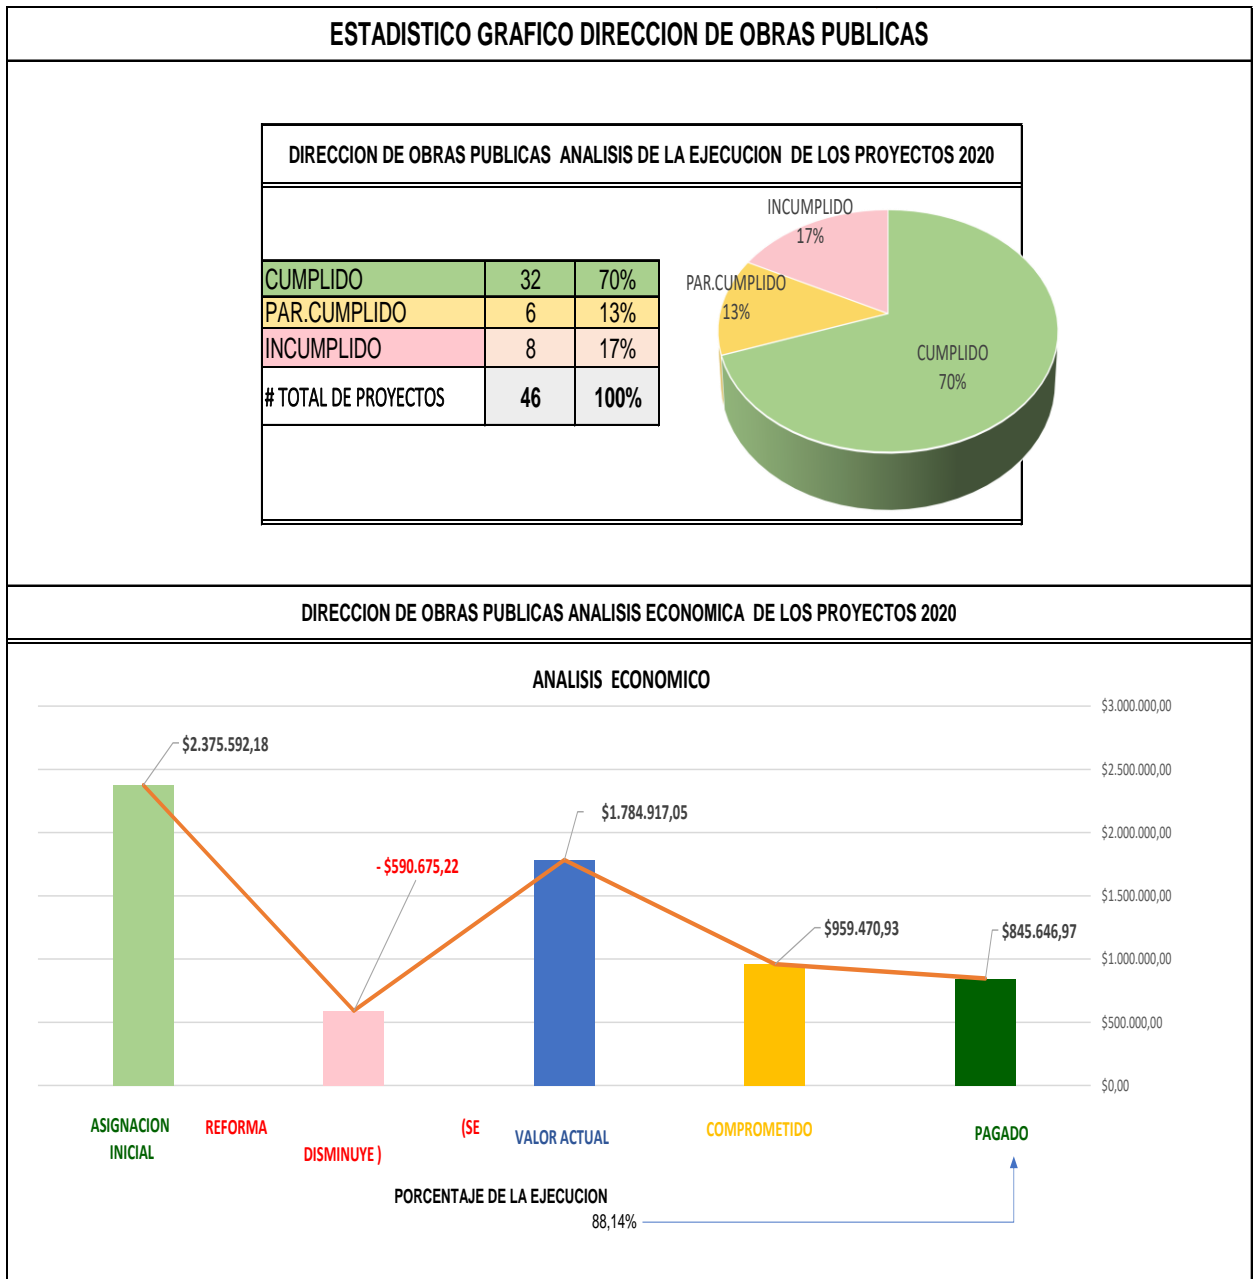

8.9 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROYECTOS.

<p>● Cumplido: 85% y el 100%</p> <p>● Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%</p> <p>● Incumplido: 0 a 69,9%</p>	<p>DIRECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 2020 ALCANZE DE LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDYOT</p>
--	---

DIRECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS		OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTABLECER UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ESTRUCTURADO, PLANIFICADO Y SOSTENIBLE QUE APORTE AL DESARROLLO DE NUEVOS POLOS DE DESARROLLO EN LAS ÁREAS RURALES MEDIANTE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO, PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN ARCHIDONA.											
POLITICA: GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO						META: REPOTENCIAR EL MERCADO CENTRAL DEL CANTÓN ARCHIDONA HASTA AL 2022							
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.5.05.01.043	Repotenciación Y saneamiento Del Mercado Central De Archidona	\$176.329,88	\$0,00	\$176.329,88	\$174.185,11	\$88.556,19	51%	NUMERO	1	0,8	80%	PAR. CUMPLIDO	-

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS		OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTABLECER UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ESTRUCTURADO, PLANIFICADO Y SOSTENIBLE QUE APORTE AL DESARROLLO DE NUEVOS POLOS DE DESARROLLO EN LAS ÁREAS RURALES MEDIANTE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO, PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN ARCHIDONA.											
POLITICA: GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO						META: MANTENER OPERATIVO AL 100% EL SERVICIO DE AGUA EN LOS HOGARES DE CANTÓN ARCHIDONA AL 2024							
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.3.08.19.001	Adquisición de 5985 kilos de hipoclorito de calcio granulado al 65% mínimo de cloro disponible para las plantas de agua administradas por el gobierno autónomo descentralizado municipal de	\$0,00	\$19.465,60	\$19.465,60	\$12.185,60	\$12.185,60	100%	PORCENTAJE	100%	100%	100%	CUMPLIDO	-
8.4.01.04	Adquisición de maquinaria para trabajo de instalación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario a más de la reparación de las mismas en el cantón Archidona	\$752.882,44	\$752.882,44	\$752.882,44	\$723.520,00	\$723.520,00	100%					CUMPLIDO	-
8.4.01.05	adquisición de 2 camionetas 4x4 diesel	\$104.592,00	-\$33.830,40	\$70.761,60	\$70.761,60	\$70.761,60	100%					CUMPLIDO	-

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS		OBJETIVO ESTRATEGICO: Establecer un sistema de asentamientos humanos, estructurado, planificado y sostenible que aporte al desarrollo de nuevos polos de desarrollo en las áreas rurales mediante la dotación de servicios públicos fundamentales, accesibilidad y la regularización de los asentamientos humanos de hecho, para el bienestar de los habitantes del cantón Archidona.											
POLITICA: GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES, ACCESIBILIDAD Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO						META: Cambio de 4 kilómetros de la redes de distribución de agua potable para el casco urbano de Archidona hasta el 2024							
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
75.01.01.018	Regeneración de la avenida Napo	\$0,00	\$100.991,88	\$100.991,88	\$0,00	\$0,00	0%	PORCENTAJE	LA META ESTA ESTIPULADA DESDE EL 2022	LA META ESTA ESTIPULADA DESDE EL 2022	LA META ESTA ESTIPULADA DESDE EL 2022	SIN EJECUTAR	-

TOTAL	\$1.033.804,32	\$839.509,52	\$1.120.431,40	\$980.652,31	\$895.023,39	91%
--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	-----

GESTION, CONTROL AMBIENTAL Y AGUA POTABLE (CONSULTORIAS - ESTUDIOS)

COMPONENTE: BIOfísICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL IRREPETIBLE DE LA ZONA, A TRAVÉS DEL AUMENTO DE CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN ARCHIDONA.
POlÍTICA: IMPULSAR LAS CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE	META: FORTALECER LOS PROCESOS PARA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, A FIN DE QUE EL 100% DE LOS PROYECTOS QUE OPERAN EN EL CANTÓN ARCHIDONA, CUENTEN CON UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SU RESPECTIVA LICENCIA, HASTA 2024.

PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FÍSICO PROYECTO	REFORMA
7.3.06.01.001	Tercera Auditoría Ambiental Tres Licencias Ambientales Planes Maestros(2019)	\$20.160,00	\$0,00	\$20.160,00	\$0,00	\$0,00	0%	PORCENTAJE	92%	52%	57%	PAR CUMPLIDO	-
7.3.06.01.002	Servicios profesionales elaboración de informes de auditoría	\$60.000,00	\$70.000,00	\$130.000,00	\$17.785,58	\$2.195,20	12%					CUMPLIDO	-
7.3.06.01.003	Consultoría de mapas de riesgos, equipos v fortalecimientos de	\$48.000,00	-\$48.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%					INCUMPLIDO	8.39. TRASPASO DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE TERRENOS PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y ADITORIAS AMBIENTALES
7.3.06.01.012	Segunda Auditoría Ambiental De Cumplimiento Periodo 2015-2016	\$8.960,00	\$0,00	\$8.960,00	\$0,00	\$0,00	0%					SIN EJECUTAR	-
7.3.06.01.013	Segunda Auditoría Ambiental De Cumplimiento De Las Tres Licencias(2019)	\$20.160,00	\$0,00	\$20.160,00	\$0,00	\$0,00	0%					PAR CUMPLIDO	-
7.3.06.01.014	Tercera Auditoría Ambiental De Cumplimiento Periodo 2017,2018	\$8.958,88	\$0,00	\$8.958,88	\$0,00	\$0,00	0%					PAR CUMPLIDO	-
77.01.02	Tasas ambientales	\$24.033,36	-\$15.832,54	\$8.200,82	\$8.200,82	\$8.150,82	99%					CUMPLIDO	-

COMPONENTE: BIOfísICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL IRREPETIBLE DE LA ZONA, A TRAVÉS DEL AUMENTO DE CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN ARCHIDONA.
POlÍTICA: IMPULSAR LAS CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE	META: ALCANZAR HASTA EL AÑO 2024 UN 6 % DE REGENERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ÁREAS DEFORESTADAS, ASÍ COMO EL CUIDADO DEL RECURSO HÍDRICO DEL CANTÓN ARCHIDONA.

PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FÍSICO PROYECTO	REFORMA
7.3.15.15	Plantas(Reforestacion)	\$50.000,00	-\$25.000,00	\$25.000,00	\$12.006,27	\$5.648,70	47%	PORCENTAJE	70,30%	70,34%	100%	CUMPLIDO	-
TOTAL II		\$240.272,24	-\$18.832,54	\$221.439,70	\$37.992,67	\$15.994,72	42%						

AGUA POTABLE

COMPONENTE: BIOfísICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL IRREPETIBLE DE LA ZONA, A TRAVÉS DEL AUMENTO DE CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN ARCHIDONA.
POlÍTICA: IMPULSAR LAS CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE	META: MANTENER OPERATIVO AL 100% EL SERVICIO DE AGUA EN LOS HOGARES DE CANTÓN ARCHIDONA AL 2024

PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FÍSICO PROYECTO	REFORMA
7.3.08.19.001	Adquisición de 5985 kilos de hipoclorito de calcio granulado al 65% mínimo de cloro disponible para las plantas de agua administradas por el gobierno autónomo descentralizado municipal de archidona cantón archidona provincia de napo	\$72.670,58	\$0,00	\$72.670,58	\$4.352,26	\$3.900,39	90%	PORCENTAJE	100%	100%	100%	CUMPLIDO	-

COMPONENTE: BIOfísICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL IRREPETIBLE DE LA ZONA, A TRAVÉS DEL AUMENTO DE CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN ARCHIDONA.
POlÍTICA: IMPULSAR LAS CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE	META: INCREMENTAR LA COBERTURA DE DOTACIÓN DE AGUA TRATADA EN EL ÁREA RURAL EN UN 25,81% HASTA EL 2024.

PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FÍSICO PROYECTO	REFORMA
7.5.01.01.008	Culminación del mejoramiento y optimización del sistema regional de agua	\$86.962,84	-\$5.050,51	\$81.912,38	\$81.912,33	\$81.912,33	100%	PORCENTAJE	41,7%	41,7%	100%	CUMPLIDO	-
7.5.01.01.012	Construcción De Proyecto De Agua Potable Cantonal	\$384.778,17	-\$324.044,71	\$60.733,48	\$10.733,46	\$10.733,46	100%					CUMPLIDO	-
TOTAL III		\$544.411,59	-\$329.095,22	\$215.316,44	\$96.998,05	\$96.546,18	100%						

DESECHOS SOLIDOS

COMPONENTE: BIOFISICO		OBJETIVO ESTRATEGICO : CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL IRREPETIBLE DE LA ZONA, A TRAVÉS DEL AUMENTO DE CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN ARCHIDONA.											
POLITICA: IMPULSAR LAS CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		META: MANTENER LA COBERTURA AL 100% DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN ARCHIDONA HASTA EL 2024.											
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.3.04.18.001	Contratación del Servicio de Limpieza: Barrido de Calles y Desbroce de maleza, en el sector Urbano	\$260.566,39	-\$115.451,35	\$145.115,04	\$145.115,04	\$94.225,32	65%	PORCENTAJE	100%	100%	100%	CUMPLIDO	-
7.3.05.05	Contrato de recolección y transporte de desechos sólidos	\$278.704,40	\$4.900,00	\$283.604,40	\$278.021,66	\$208.705,20	75%					CUMPLIDO	-

COMPONENTE: BIOFISICO		OBJETIVO ESTRATEGICO : CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL IRREPETIBLE DE LA ZONA, A TRAVÉS DEL AUMENTO DE CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN ARCHIDONA.											
POLITICA: IMPULSAR LAS CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		META: FORTALECER LOS PROCESOS PARA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, A FIN DE QUE EL 100% DE LOS PROYECTOS QUE OPERAN EN EL CANTÓN ARCHIDONA, CUENTEN CON UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SU RESPECTIVA LICENCIA, HASTA 2024.											
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.3.06.05.011	Consultoría para el mejoramiento y reposición de los estudios y diseños para la gestión integral de desechos sólidos del Cantón Archidona	\$74.912,32	\$0,00	\$74.912,32	\$74.912,32	\$52.438,62	70%	PORCENTAJE	92%	64%	70%	PAB. CUMPLIDO	-


COMPONENTE: BIOFISICO		OBJETIVO ESTRATEGICO : CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL IRREPETIBLE DE LA ZONA, A TRAVÉS DEL AUMENTO DE CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN ARCHIDONA.											
POLITICA: IMPULSAR LAS CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		META: INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN ARCHIDONA HASTA ALCANZAR UN 58% HASTA EL 2024.											
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.3.14.03	Dotación para mobiliarios para el almacenaje temporal y reciclaje de los desechos sólidos en el cantón archidona	\$12.768,00	\$0,00	\$12.768,00	\$12.131,84	\$12.131,84	100%					CUMPLIDO	-
7.5.02.03.001	Construcción E instalación Del Sistema Eléctrico Del Relleno Sanitario	\$49.108,80	\$0,00	\$49.108,80	\$49.108,80	\$40.994,49	83%	PORCENTAJE	50,3%	51%	101%	CUMPLIDO	-
7.5.05.01.045	Reparación De Geomembrana Del Relleno Sanitario Sector Santa Elena	\$0,00	\$852,00	\$852,00	\$851,20	\$851,20	100%					CUMPLIDO	-
TOTAL IV		\$676.059,91	-\$109.699,35	\$566.360,56	\$560.140,86	\$409.346,67	73%						

TOTAL GENERAL	\$2.494.548,06	\$381.882,41	\$2.123.548,10	\$1.675.783,89	\$1.416.910,96	85%							
----------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

CTEA Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Con Planta (ALCANTARILLADO)

COMPONENTE: BIOFISICO		OBJETIVO ESTRATEGICO : CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL IRREPETIBLE DE LA ZONA, A TRAVÉS DEL AUMENTO DE CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN ARCHIDONA.											
POLITICA: IMPULSAR LAS CAPACIDADES QUE REGULEN, PREVENGAN, REMEDIEN Y MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN, PÉRDIDA DE ESPECIES ENDEMICAS, DÉFICIT HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		META: INCREMENTAR LA COBERTURA DE DOTACIÓN DE AGUA TRATADA EN EL ÁREA RURAL EN UN 25,81% HASTA EL 2024.											
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	INDICADOR	META PLANIFICADA ALCANZAR EN EL 2020	META ALCANZADA 2020	META ALCANZADA EN PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO FISICO PROYECTO	REFORMA
7.5.01.03.013	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Con Planta CTEA	\$0,00	\$2.480.427,44	\$2.480.427,44	\$0,00	\$0,00	0%	PORCENTAJE	SE INGRESO EL RECURSO AL FINANZIAR EL AÑO PROYECTO 2021			SIN EJECUTAR	-
TOTAL GENERAL		\$0,00	\$2.480.427,44	\$2.480.427,44	\$0,00	\$0,00	0%						

8.10 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ANÁLISIS ECONÓMICO.

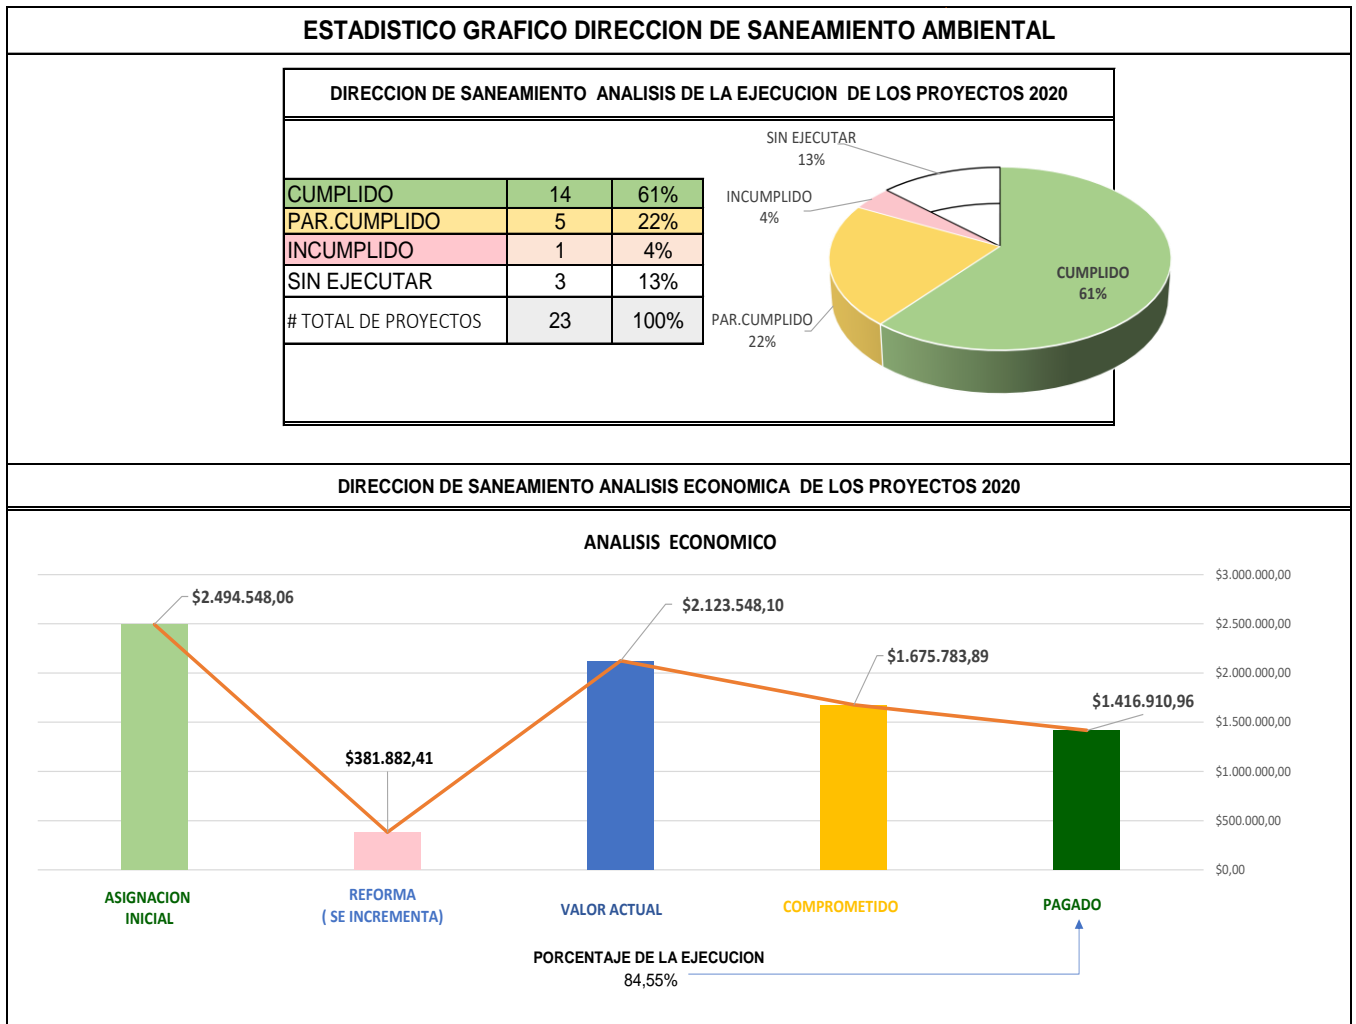

9. EMERGENCIA SANITARIA PROYECTOS.

<p>Cumplido: 85% y el 100%</p> <p>Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%</p> <p>Incumplido: 0 a 69,9%</p>	<h1>EMERGENCIA SANITARIA</h1>
---	-------------------------------

RECURSO DE LA CTEA		VALOR TRANSFERIDO AL GADMA : \$ 85 290,81					
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION DEL PROYECTO
7.5.05.01.008	Mantenimiento reparación y adecuación de las instalaciones del ex cuartel de la policía nacional del Cantón Archidona, para el traslado de la policía judicial zonal (CTEA) (30%)	\$0,00	\$7.865,12	\$7.865,12	\$7.865,11	\$7.865,11	100%
73.08.21	Implementación de albergue para personas infectadas por covid-19	\$0,00	\$17.720,08	\$17.720,08	\$17.720,08	\$17.720,08	100%
	Adquisición de 1523 kits de alimentación para la entrega de grupos sociales afectados por el estado de emergencia	\$0,00	\$21.322,00	\$21.322,00	\$21.322,00	\$21.322,00	100%
	Adquisición de materiales de bioseguridad para el personal de primera línea	\$0,00	\$25.511,33	\$25.511,33	\$25.511,33	\$25.511,33	100%
	Adquisición de alcohol para el personal de primera línea	\$0,00	\$12.764,01	\$12.764,01	\$12.764,01	\$12.764,01	100%
RECURSO TOTAL DE LA CTES PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA		\$0,00	\$85.182,54	\$85.182,54	\$85.182,53	\$85.182,53	100%

RECURSO DEL GADMA PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA							
RECURSO DEL GADMA PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION DEL PROYECTO
73.08.21	ADQUISICION DE KIT ALIMENTICIOS NO PERECIBLES	\$0,00	\$170.987,17	\$42.000,00	\$42.000,00	\$42.000,00	100%
	Adquisición de colchones tipo esponja para el centro de rehabilitación social	\$0,00		\$448,00	\$448,00	\$448,00	100%
	Servicio de alquiler de vehículo para la movilización de la entrega de los kit de alimentación	\$0,00		\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	100%
	Servicio de alimentación dentro del proyecto de apoyo a grupos sociales	\$0,00		\$4.926,88	\$4.926,88	\$4.926,88	100%
	Adquisición de 4000 kits alimenticios, para personas afectadas por el estado de emergencia sanitaria covid-19	\$0,00		\$56.000,00	\$56.000,00	\$56.000,00	100%
	Adquisición de equipos de protección personal para las personas que se encuentran aisladas por la enfermedad del covid-19	\$0,00		\$15.992,29	\$15.992,29	\$15.992,29	100%
73.08.21	Adquisición de kit alimenticios para personas que se encuentran aisladas	\$0,00	\$3.124,80	\$3.124,80	\$3.124,80	\$3.124,80	100%
	Adquisición de equipos de protección personal y kit alimenticios para las personas aisladas de covid-19	\$0,00	\$3.136,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	70%
	servicio de alimentación para la ejecución del proyecto de apoyo a grupos sociales y entidades afectados por el covid-19	\$0,00	\$2.913,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00	70%
TOTAL		\$0,00	\$170.987,17	\$130.041,09	\$123.991,97	\$123.991,97	100%
8.4.01.05	Vehículos (Ambulancia)	\$0,00	\$84.277,13	\$84.277,13	\$84.039,20	\$84.039,20	100%
TOTAL GENERAL I		\$0,00	\$255.264,30	\$214.318,22	\$208.031,17	\$208.031,17	100%

RECURSO DEL GADMA PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA DIRECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL							
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION DEL PROYECTO
73.08.21	Servicio de fumigacion para el dengue en el sector urbano y rural del cantona Archidona	\$0,00	\$50.489,32	\$9.676,73	\$9.676,73	\$9.676,73	100%
	Servicio de fumigacion para el dengue en el sector urbano y rural del cantona Archidona	\$0,00		\$5.546,03	\$5.546,03	\$5.546,03	100%
	Servicio de fumigacion durabte la emergencia covid-19	\$0,00		\$35.266,56	\$35.266,56	\$35.266,56	100%
TOTAL		\$0,00	\$50.489,32	\$50.489,32	\$50.489,32	\$50.489,32	100%
73.05.05	Vehículos	\$0,00	\$1.680,00	\$1.680,00	\$1.500,00	\$1.500,00	100%
7.3.08.26	Dispositivos Médicos De Uso General	\$0,00	\$3.606,40	\$3.606,40	\$3.605,28	\$3.605,28	100%
TOTAL GENERAL II		\$0,00	\$55.775,72	\$55.775,72	\$55.594,60	\$55.594,60	100%
RECURSO DEL GADMA PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA DIRECCION DE PLANIFICACION							
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION DEL PROYECTO
84.01.06	HERRAMIENTAS	\$0,00	\$1.430,00	\$1.430,00	\$1.430,00	\$1.430,00	100%
TOTAL GENERAL III		\$0,00	\$1.430,00	\$1.430,00	\$1.430,00	\$1.430,00	100%
RECURSO DEL GADMA PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL							
PARTIDA	PROYECTO	Asignación Inicial	Reformas	Valor Actual	Comprometido	Pagado	% DE EJECUCION DEL PROYECTO
53.02.06	SERVICIO DE VOLUNTARIADO	\$0,00	\$6.500,00	\$6.500,00	\$6.500,00	\$6.500,00	100%
TOTAL GENERAL IV		\$0,00	\$6.500,00	\$6.500,00	\$6.500,00	\$6.500,00	100%
RECURSO TOTAL DEL GADMA PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA		\$0,00	\$318.970,02	\$278.023,94	\$271.555,77	\$271.555,77	100%

10. CONCLUSIONES GENERALES

- ✓ Evaluar sistemáticamente el progreso de los Planes Operativos Anuales, es una tarea que permite a las autoridades disponer de la información técnica necesaria para tomar decisiones pertinentes con respecto a los proyectos que ejecutan las dependencias municipales.
- ✓ Se deben adoptar por parte de las Autoridades y Directores la pertinencia de mantener o no los proyectos de arrastre con criterio coherente para el desarrollo del cantón y las medidas oportunas para la reprogramación y la toma de decisiones en los proyectos que se arrastrarían al presente ejercicio fiscal respecto a las líneas estratégicas establecidas inicialmente.
- ✓ Debido a la **EMERGENCIA SANITARIA** no se ha podido cumplir completamente con la planificación operativa anual ya que se han realizado traspasos de crédito para atender la emergencia sanitaria, lo que ha ocasionado que muchas actividades dejen de ejecutarse.
- ✓ Se suspendieron diversas actividades porque son de contacto directo con las personas, por tanto, no son factibles su ejecución debido a la emergencia sanitaria.
- ✓ Algunas metas de proyectos del POA presentan un elevado o bajo cumplimiento, ya que por la emergencia sanitaria se afectó su ejecución en relación a lo planificado, los ajustes se realizarán en los traspasos.
